



ArcelorMittal

ArcelorMittal Ostrava

Rozvojové investice a EIA

Ing. Petr Baranek

Konference EIA/SEA 2013
Ostrava, 14.-15. května 2013

20 let EIA – 20 projektů – 5x realizace



ArcelorMittal

1999 – **Minihut' (ZPO2 + P1500), ZPO3, Minihut'1 (KD)**

2000 – *Modernizace HCC*

2004 – *VKB12*

2005 – *Mořírna*

2006 – *Zinkovna, Tavící agregát*

2007 – *EBT pece, Modernizace VKB11 (NE ČIŽP)*

2008 – *Instalace BOF technologie a ZPO4*

2009 – *Rekonstrukce ZPO1 (NE MŽP)*

2010 – *PCI, Modernizace ocelárny, **Komplexní změna ZPO***

2011 - *Plynojem, Kotel K12, Kotel K14*

2012 – **DeNOx K8-K10**

EIA Projekty – Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a.s.(1)



ArcelorMittal



Důvod realizace:

- Zvýšení odlévaného průřezu sochorů
- Zvýšení kvality oceli pro výrobu trubek


Zachování celkové kapacity ZPO1, 2 a 3

	Stávající	Nová
PP&ZPO1	– 1.1Mt/r	→ 1.4Mt/r + VD
PP&ZPO2	– 1.5Mt/y	→ 1.2Mt/y
PP&ZPO3	– 1.0Mt/y	→ 1.0Mt/y
Celkem	3.6Mt/r	→ 3.6Mt/r

EIA Projekty – Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a.s.(2)



ArcelorMittal

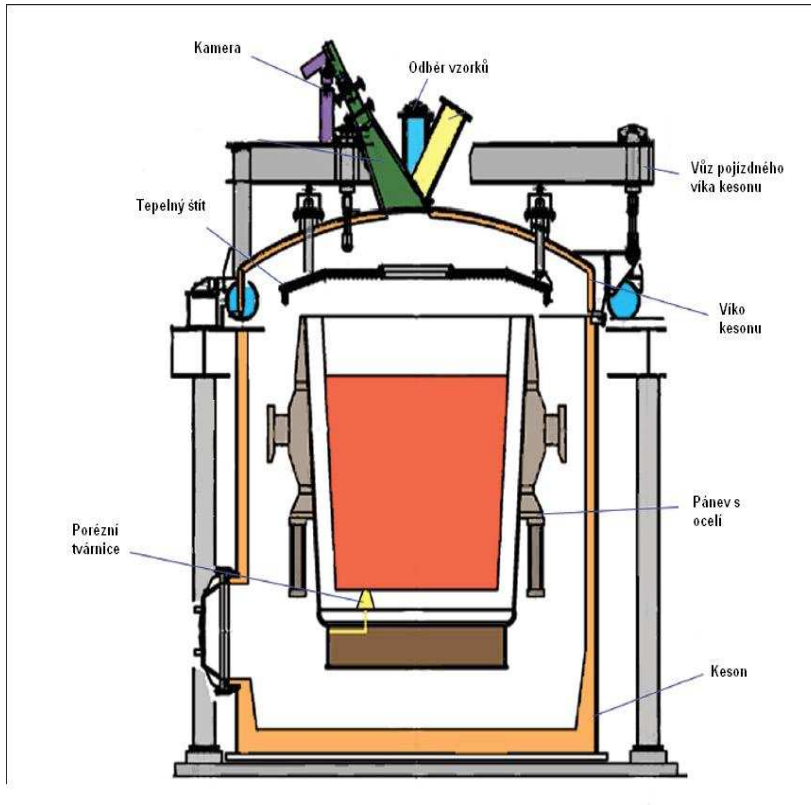

Schema vakuovací stanice

BAT technologie:

Odprášení VD tkaninovými filtry
=> emise TZL < 20mg/m³

Bilance emisí do ovzduší:

PM₁₀: - 98.8 t/r (+5.5 - 104.3)

B(a)P: - 84 g/r (+11 - 95)

As: - 466 g/r (+50 - 516)

Kompenzace:

- 90% požadovaných emisí TZL na Aglo Sever
- Odprášení vápenných cest (2. etapa)

Plánovaný termín realizace:

2011 - 2012

EIA Projekty – Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a.s.(3)



ArcelorMittal

Průběh projednávání:

- 01/2010 - podání 1. žádosti na MŽP
- 04-06/2010 - kladná stanoviska všech dotčených orgánů vč. posudku (proti jen o.s. Vzduch)
- 07/2010 - veřejné projednání
- 09/2010 - **zamítnutí projektu**
- 01/2011 - nová dokumentace a 2. žádost na ukončení procesu EIA po zjišťovacím řízení (předem konzultováno s MŽP i zpracovatelem posudku)
- 02-03/2011 - kladná stanoviska všech dotčených orgánů (proti je opět jen o.s. Vzduch)
- 03/2011 - otevřený dopis doc. Jančíka (TU-VŠB) - (nesouhlas s kompenzací)
- 04/2011 - dohoda s doc. Jančíkem na další kompenzaci (zaslána na MŽP)
- 04/2011 - rozhodnutí MŽP o nutnosti celého procesu EIA
- 08/2011 - veřejné projednání
- 10/2011 - souhlasné stanovisko (30 podmínek)

- 03/2012 – Územní rozhodnutí
- 03/2013 – Stavební povolení



ArcelorMittal

20 let EIA - Shrnutí

- Neúnosné **prodlužování doby** projednávání – riziko **ztráty zákazníků**
- Téměř **nemožnost realizace** modernizačních projektů
- Požadavky a podmínky **nesouvisející** s realizovaným záměrem
- Nutnost „**DEKLARACE POROZUMĚNÍ**“?



ArcelorMittal

Děkuji za pozornost

